

興革事項名稱：炊場西側作業區整地

完成時間：103年1月22日

主辦科室：作業科



未整地前。



整地及鋼筋鋪設中。



地坪澆置。



地坪澆置完成。

效益分析：改善炊場西側外部作業區泥濘地面，以維持環境整潔。

興革事項名稱：五教區設置衣物被套煮沸消毒用具

完成時間：103年2月12日

主辦科室：作業科



煮沸器具、瓦斯桶保護座加工。



煮沸器具收藏保護座完成照片

效益分析：為防止傳染疾病散播，特提供新收房受刑人衣物、棉被套消毒煮沸器具。

興革事項名稱：本監各工場巡迴書箱整修案

完成時間：103年2月7日

主辦科室：作業科



整修前情形（一）



整修中情形（二）



整修中之情形（三）



整修後之情形（四）

效益分析：以舊有書箱重新塗裝、各配件更新，改善書籍管理、擺放美觀及整體性。

興革事項名稱：本監圖書室隔間(防火板裝潢)案

完成時間：103年2月7日

主辦科室：作業科



汰換前情形（一）



汰換中情形（二）



汰換中之情形（三）



汰換後之情形（四）

效益分析：以防火建材(矽酸鈣板)裝潢及具環保塗料塗裝隔間，改善圖書室資料、書籍安全。


興革事項名稱：平二舍通道門隔絕設施

完成時間：103年3月4日

主辦科室：作業科



平二舍東側通道門。

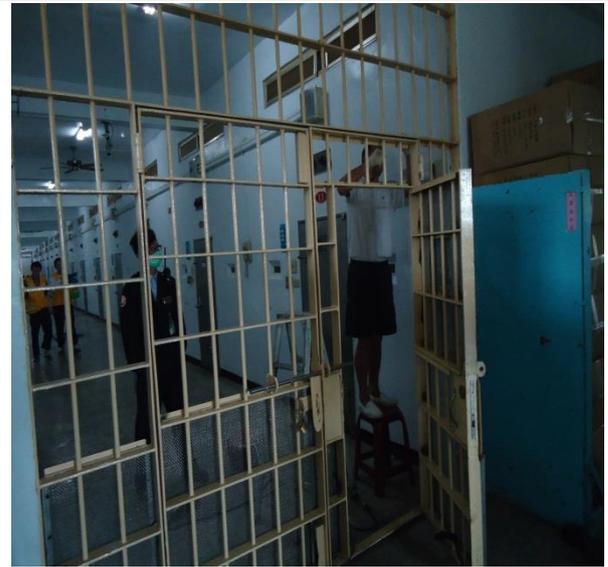

平二舍通道門加工。



平二舍通道門加工。



平二舍通道門加工完成。

效益分析：於平二舍末端通道門設置阻絕網及鋼板，以防止、隔絕新收房與工場間之不當接觸。

興革事項名稱：本監配合宜蘭縣政府環境保護局「再生家具」整修案

完成時間：103年3月6日

主辦科室：作業科



整修前情形（一）



整修前情形（二）



整修中情形（一）



整修後情形（二）

效益分析：彰顯現行矯正機關辦理技能訓練之成果。

興革事項名稱：戒護科廁所天花板整修

完成時間：103 年 3 月 12 日

主辦科室：作業科



原木作天花板。



輕鋼架天花板施工



木作天花板拆除



輕鋼架天花板施工完成

效益分析：戒護科廁所天花板原為麗光板材質，因易受潮導致耐久性不佳並影響觀瞻；經營繕隊整修改為輕鋼架 PVC 板後，顯得光亮潔淨煥然一新。

興革事項名稱：本監各場舍庫房木門開啟瞻視孔整修案

完成時間：103年3月14日

主辦科室：作業科



整修前情形（一）



整修中情形（二）



整修中之情形（三）



整修後之情形（四）

效益分析：強化收容人生活動態監控、藉機傳遞物品，提高戒護安全。

興革事項名稱：愛一舍防暴網施作

完成時間：103年3月18日

主辦科室：作業科



防爆網加工製作。



防爆網加工製作。



防爆網半成品。



防爆網安裝完成。

效益分析：為加強獨居病房戒護安全，特增設防爆防護網以避免戒護事故發生。

興革事項名稱：所舍集水井施工

完成時間：103年3月31日

主辦科室：作業科



所舍排水管穿越涵管。



集水井施工。



集水井施工。



集水井完工圖。

效益分析：為避免涵管因 PVC 管橫越影響排水，因此施作集水井以利排水及垃圾清除。
